



Průběžná zpráva o projektu

Název projektu Odpočinek pod korunami

Název předkladatele: Masarykova střední škola Letovice

Sídlo: Tyršova 500, Letovice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 66596882

DIČ: CZ66596882

Statutární zástupce: JUDr. Sylvie Ducháčková

Zpracoval: Ing. Marek Chládek

Zpracováno ke dni.: 25. 11. 2013

Struktura průběžné zprávy:

1. Dosavadní vývoj projektu (popis výsledků, kterých bylo dosaženo za dobu trvání projektu)

- Došlo ke zpracování **grafických podkladů** a to pro posezení, budek pro ptáky a netopýry, stupňovitých schodů, tabulek popisujících druhy stromů v okolí posezení. Návrhy zpracovávali žáci studijního oboru „Stavebnictví - pozemní stavitelství“ a „Truhlář“. Skupiny žáků pod vedením pedagogů se řídili potřebami projektu a předpokládaným finančním limitem na dané položky.

Výstupy níže:



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY







OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



Jihomoravský kraj

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

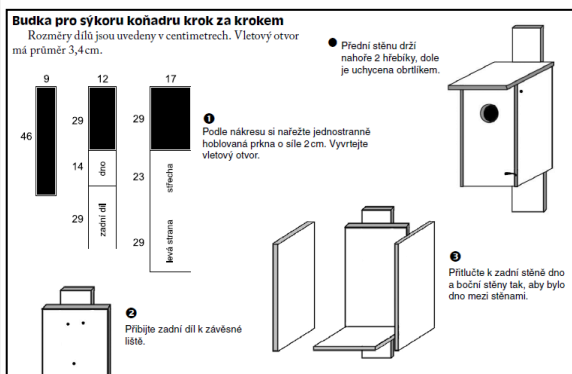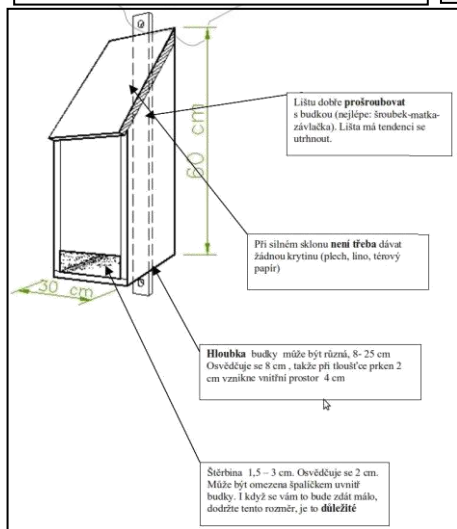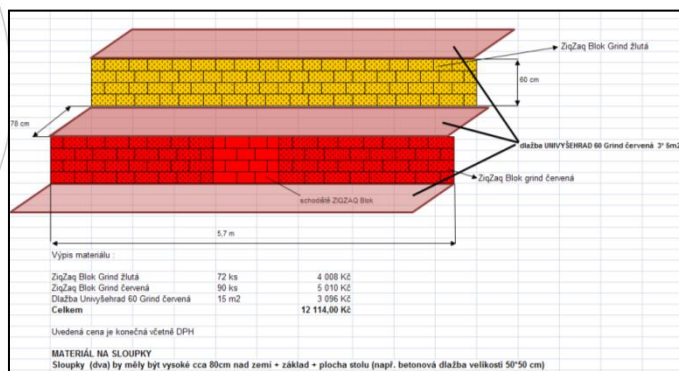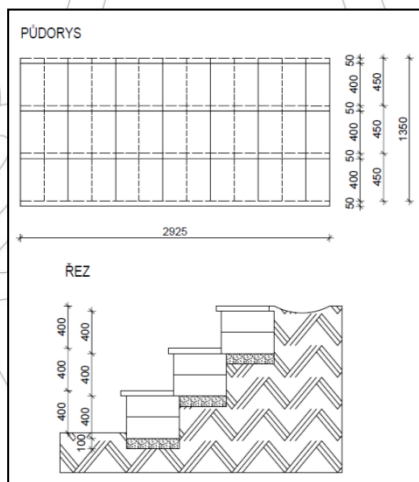

- Došlo k **nákupu materiálů** potřebných k výstavbě finančně nejnáročnější části z projektu a to betonových stupňů. Foto níže.



- Došlo k započatí zemních prací k výstavbě betonových stupňů v rámci odborného výcviku žáků oboru „Zedník“. Foto níže.





- Došlo k úklidu a výsadbě živého plotu v rámci fáze – úprava okolí. Foto níže.





- Proběhla jeho propagace projektu na webových stránkách naší školy a v regionálním tisku.
Odkaz: <http://www.stredni-skola.cz/cs/zaci-si-vybuduji-odpocinek-pod-korunami>



2. Současný stav projektu (srovnání záměrů a skutečnosti, v případě, že se některé části projektu nepodařilo uskutečnit v předpokládané podobě, uveďte příčiny a možnosti nápravy)

- Oproti plánu zbývá navrhnout další informační tabule, budou navrženy během prosince 2013
- V dřívějším termínu se započalo s budováním betonových stupňů
- V dřívějším termínu se započalo s úpravou estetiky okolí a to výsadbou živého plotu u budovy na Tyršově 500

3. Konkretizace plánů na další období

- Další fází je: výroba laviček, ptačích budek a laminátových tabulí, podle námi zadaných návrhů. Za tuto fázi budou odpovědní pedagogové zapojení do projektu a žáci a učitelé v předmětu praxe. Termín realizace - leden – únor 2014.
- Třetí fází projektu bude instalace laviček, budek a tabulí na daná místa. Dále dostavba stupňů a renovace sportovních ploch. Tuto instalaci provedou žáci oborů Zedník a Truhlář a to v předmětu praxe a odborných předmětech pod vedením nejen učitelů odborného výcviku v období březen – duben 2014.
- Bude proveden úklid míst. Místa potom budou oficiálně otevřena pro všechny. Tato poslední aktivita bude spadat do období květen 2014.
- Během celého projektu bude probíhat jeho propagace na webových stránkách naší školy a v regionálním tisku.

4. Finanční situace (celková finanční situace projektu, informace o využití dosavadních prostředků, další předpokládané výdaje.

První fakturací na účet školy dorazily prostředky 19834,- Kč.

Tyto prostředky byly využity k úhradě faktur za stavební materiály a jejich dopravu na místo stavby betonových stupňů.

- Štěrka s dopravou a vyložení 4176,- Kč
- Betonové prvky a stavební lepidlo 12114,- Kč – cena je potvrzena faktura zatím nedošla
- Doprava betonových prvků a jejich složení 2000,- Kč – cena přibližná, faktura za dopravu nám ještě nepřišla

..... **KONEC PRŮBĚŽNÉ ZPRÁVY**



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



Jihomoravský kraj

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
